

433500 - MEL - Patrimoine Eclairage
EESN Lille - STIC

22 oct. 2023

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

22 sept. 2023 - 21 nov. 2023

Avancée

50%

Tâches

26

Ressources

10

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Avancée	Durée
ETP - Eurotéléport	22/09/2023	10/10/2023	100	16
ETP - Accès 2	22/09/2023	05/10/2023	100	12
ETP - Accès 3	06/10/2023	10/10/2023	100	4
GDT - Gare de Tourcoing	11/10/2023	13/10/2023	100	3
GDT - Accès 1	11/10/2023	13/10/2023	100	3
CAR - Carliers	14/10/2023	21/10/2023	100	7
CAR - Accès 1	14/10/2023	18/10/2023	100	4
CAR - Accès 2	19/10/2023	21/10/2023	100	3
GPL - Roubaix Grand Place	17/10/2023	20/10/2023	100	4
GPL - Accès 1 - TS BAES	17/10/2023	19/10/2023	100	3
GPL - Accès 2 - TS BAES	20/10/2023	20/10/2023	100	1
GLR - Gare Jean Lebas Roubaix	24/10/2023	26/10/2023	0	3
GLR - Accès 1	24/10/2023	26/10/2023	0	3
MCX - Mairie de Croix	27/10/2023	31/10/2023	0	4
MCX - Accès 1	27/10/2023	31/10/2023	0	4
SMP - Saint Maurice Pellevoisin	02/11/2023	04/11/2023	0	3
SMP - Accès 1	02/11/2023	04/11/2023	0	3
MDL - Mairie de Lille	06/11/2023	14/11/2023	0	8
MDL - Accès 1	06/11/2023	08/11/2023	0	3
MDL - Accès 2	09/11/2023	14/11/2023	0	5
PSU - Pont Supérieur	15/11/2023	17/11/2023	0	3
PSU - Accès 1	15/11/2023	17/11/2023	0	3
PAV - Wasquehal Pavé de Lille	14/11/2023	20/11/2023	0	6
PAV - Accès 1 EM 3/4	14/11/2023	16/11/2023	0	3
PAV - Accès 2 EF	14/11/2023	16/11/2023	0	3
PAV - Accès EM 1/2	17/11/2023	20/11/2023	0	3

Ressources

Nom	Rôle par défaut
David DUPONT	Chef d'équipe
Jaouad BAMOU	Chef d'équipe
Jérôme D'ATH	Chef d'équipe
J-P PATOU	Monteur électricien
Djamel OUDINE	Intérimaire
Yamin HENCHIRI	Intérimaire
Berquit NTEMBE	Intérimaire
Sabri KHADRAOUI	Intérimaire
Yassine KHADRAOUI	Intérimaire
Amar AMRAOUI	Intérimaire

Diagramme de Gantt

EIFFAGE

ÉNERGIE SYSTÈMES

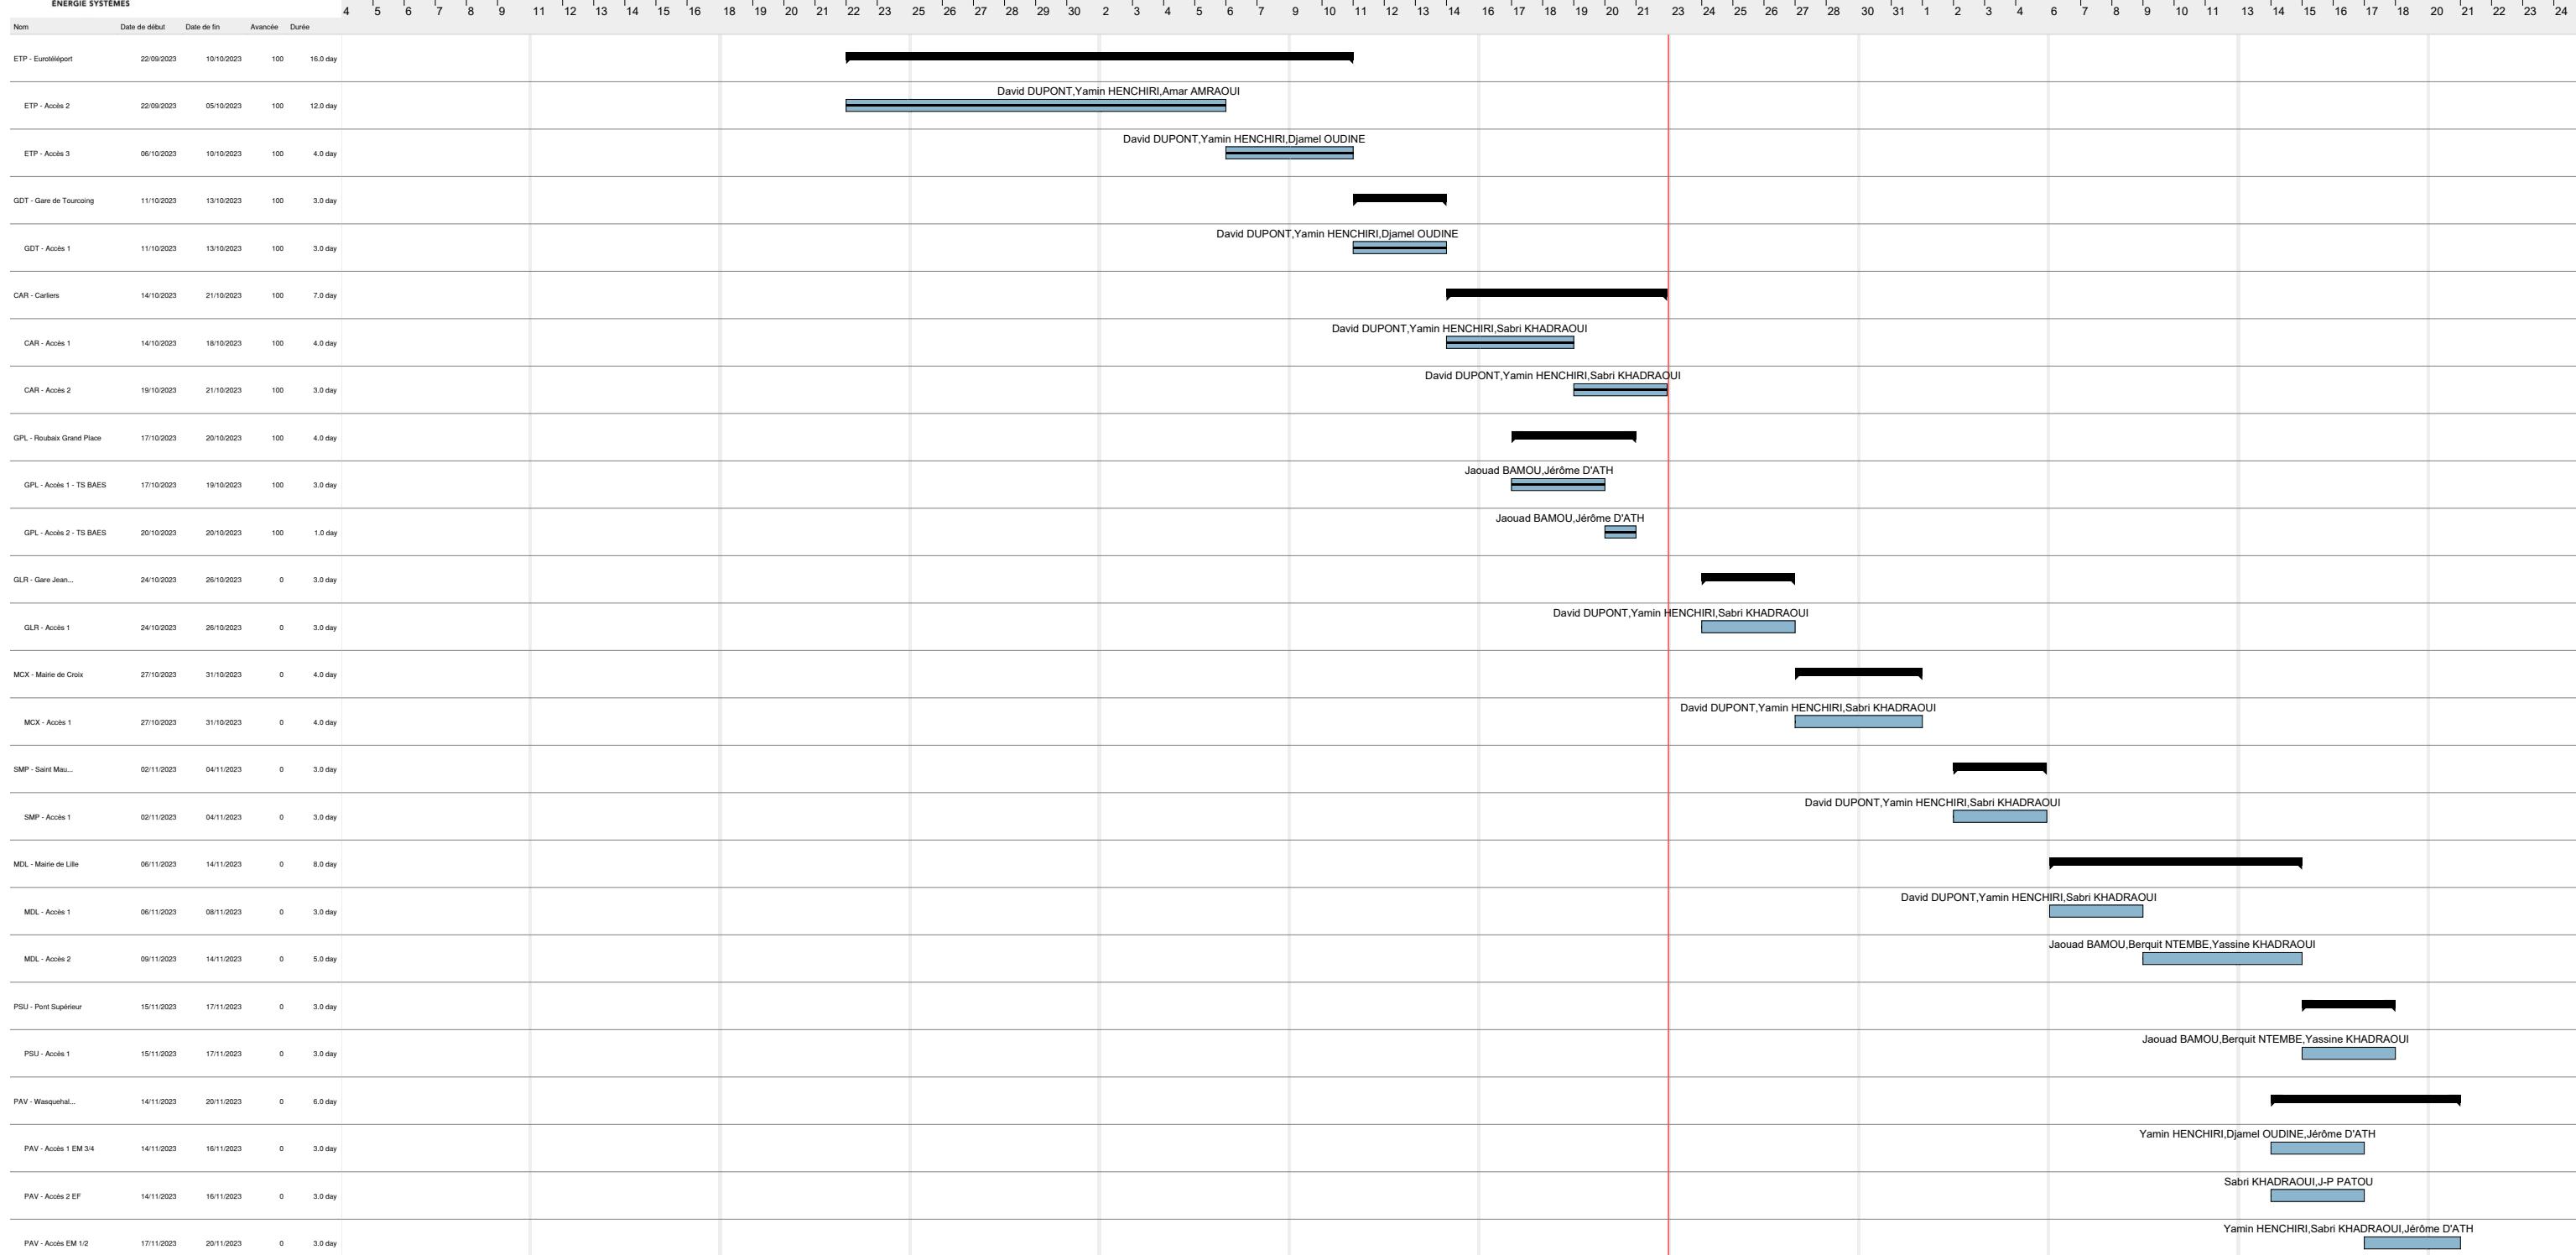


Diagramme des Ressources

EIFFAGE

ÉNERGIE SYSTÈMES

